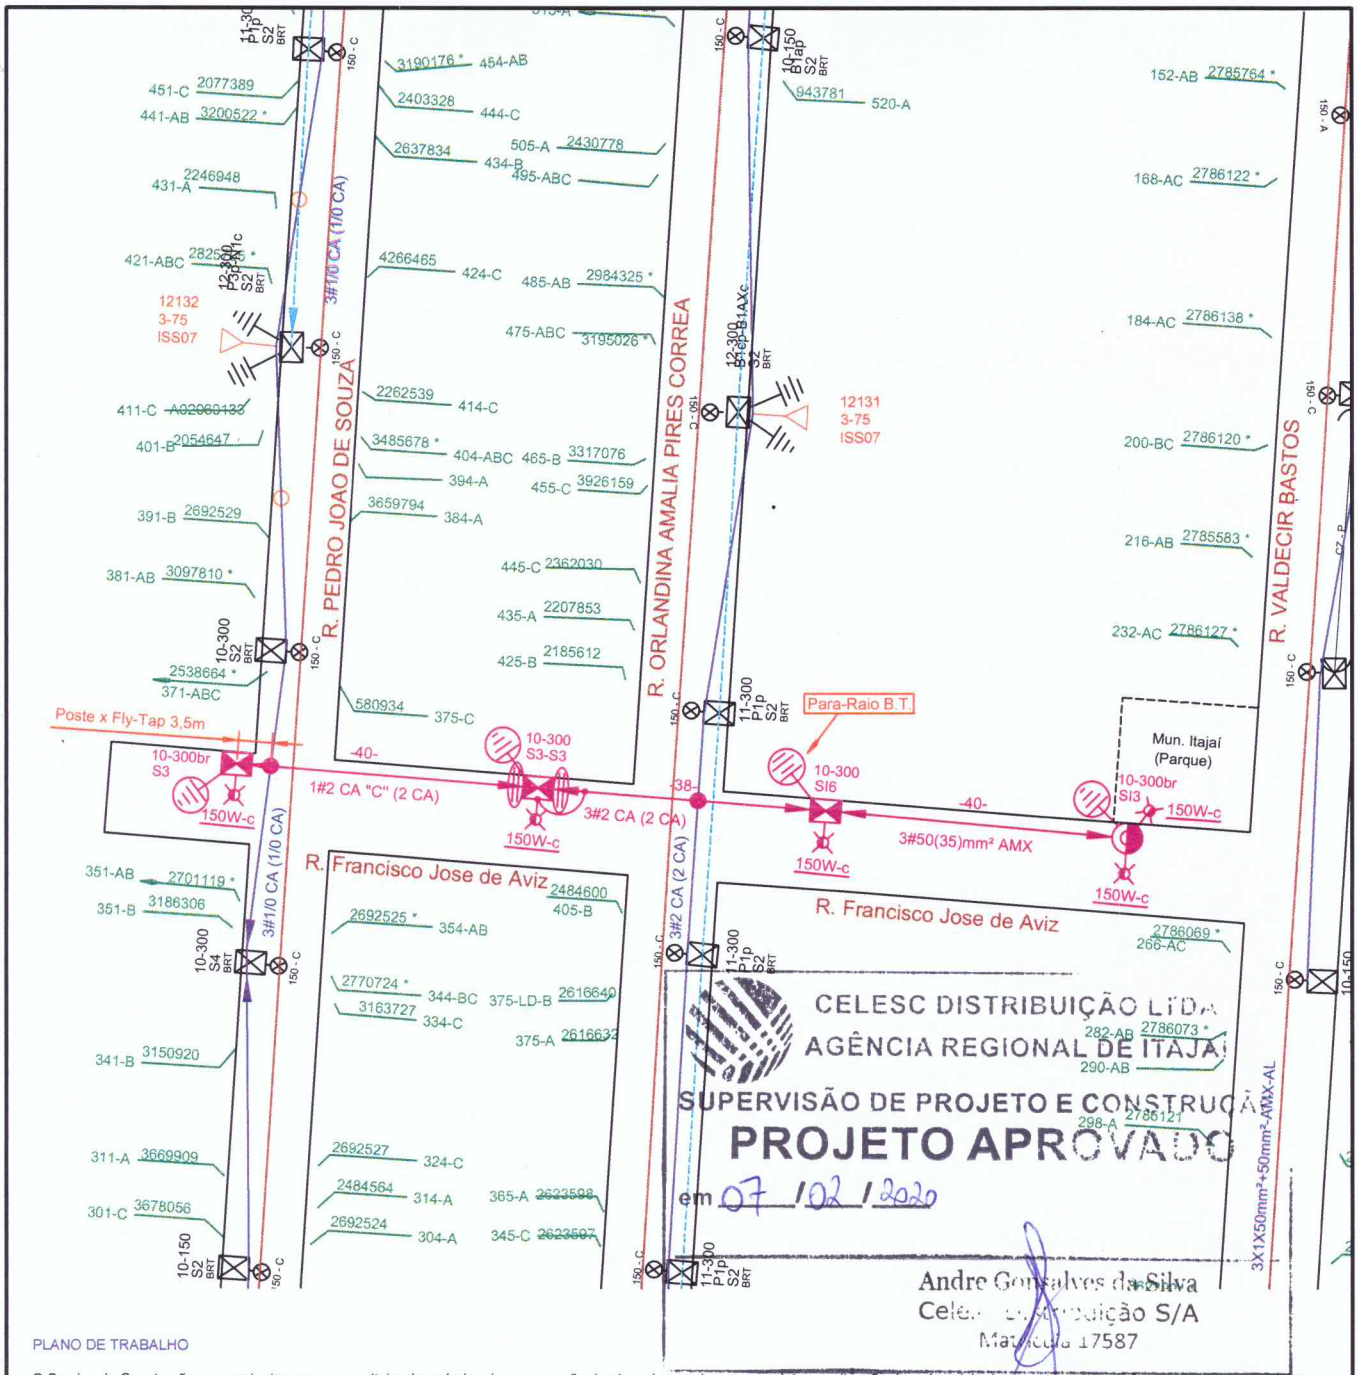


PLANO DE TRABALHO

O Serviço de Construção, em conjunto com a empreiteira deverá planejar a execução da obra, de acordo com o projeto e a situação da rede existente em campo, prevendo os recursos necessários, materiais, mão-de-obra e equipamentos - e solicitar o Desligamento/ Bloqueio de Linha Viva, seguindo as instruções Normativa em vigor na CELESC (I-332.0023-Solicitação de Desligamento e I-332.0025-Bloqueio de Religamento ). Todos os procedimentos de segurança deverão ser observados e seguidos de acordo com a NR-10. Inclusive os equipamentos a serem desligados (citados abaixo), deverão ser conferido em campo antes da execução da obra.

TRECHO A SER INTERDITADO: EQUIPAMENTO A SER DESLIGADO: FU 12131 - 12132

ALERTAMOS QUE:

Antes do início dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergência do COD, deverá desligar a rede de energia elétrica, testar, aterrar, sinalizar com placa e, posteriormente, entregar livre à empreiteira, atravéz do DTD;
Após a conclusão do trabalho, o fiscal ou equipe de emergência do COD, após receber a linha livre de empreiteira, através do DTD, providenciará a retirada do aterramento, da placa de sinalização e o fechamento da chave, energizando a rede.

SECRETARIA MUNICIPAL DE

# OBRAS

| | | |
|---|---|---|
| PROJETO | | |
| Elétrico | | |
| REFERÊNCIA | | |
| Alimentador ISS07 - FU : 12131 - 12132 - Tensão 25kV | | |
| LOCALIZAÇÃO | | ESCALA |
| Rua Francisco José de Aviz - Murta - Itajaí - SC | | 1:1000 |
| ELABORAÇÃO | | FORMATO |
| Departamento de Engenharia Elétrica | | A4 |
| DESENHO | DATA: | FOLHA |
| Fujita | 22/10/2019 | 1/1 |
